


Phase 1

Travaux Coca
Rue barrée du 27 au 29 janvier
(signalisation Coca)

Circulation maintenue pour
riverains, TC, secours...

Déviation RD164 en amont via
RD39 / RD 16 / rue Gambetta
(centre d'intervention de Nort)

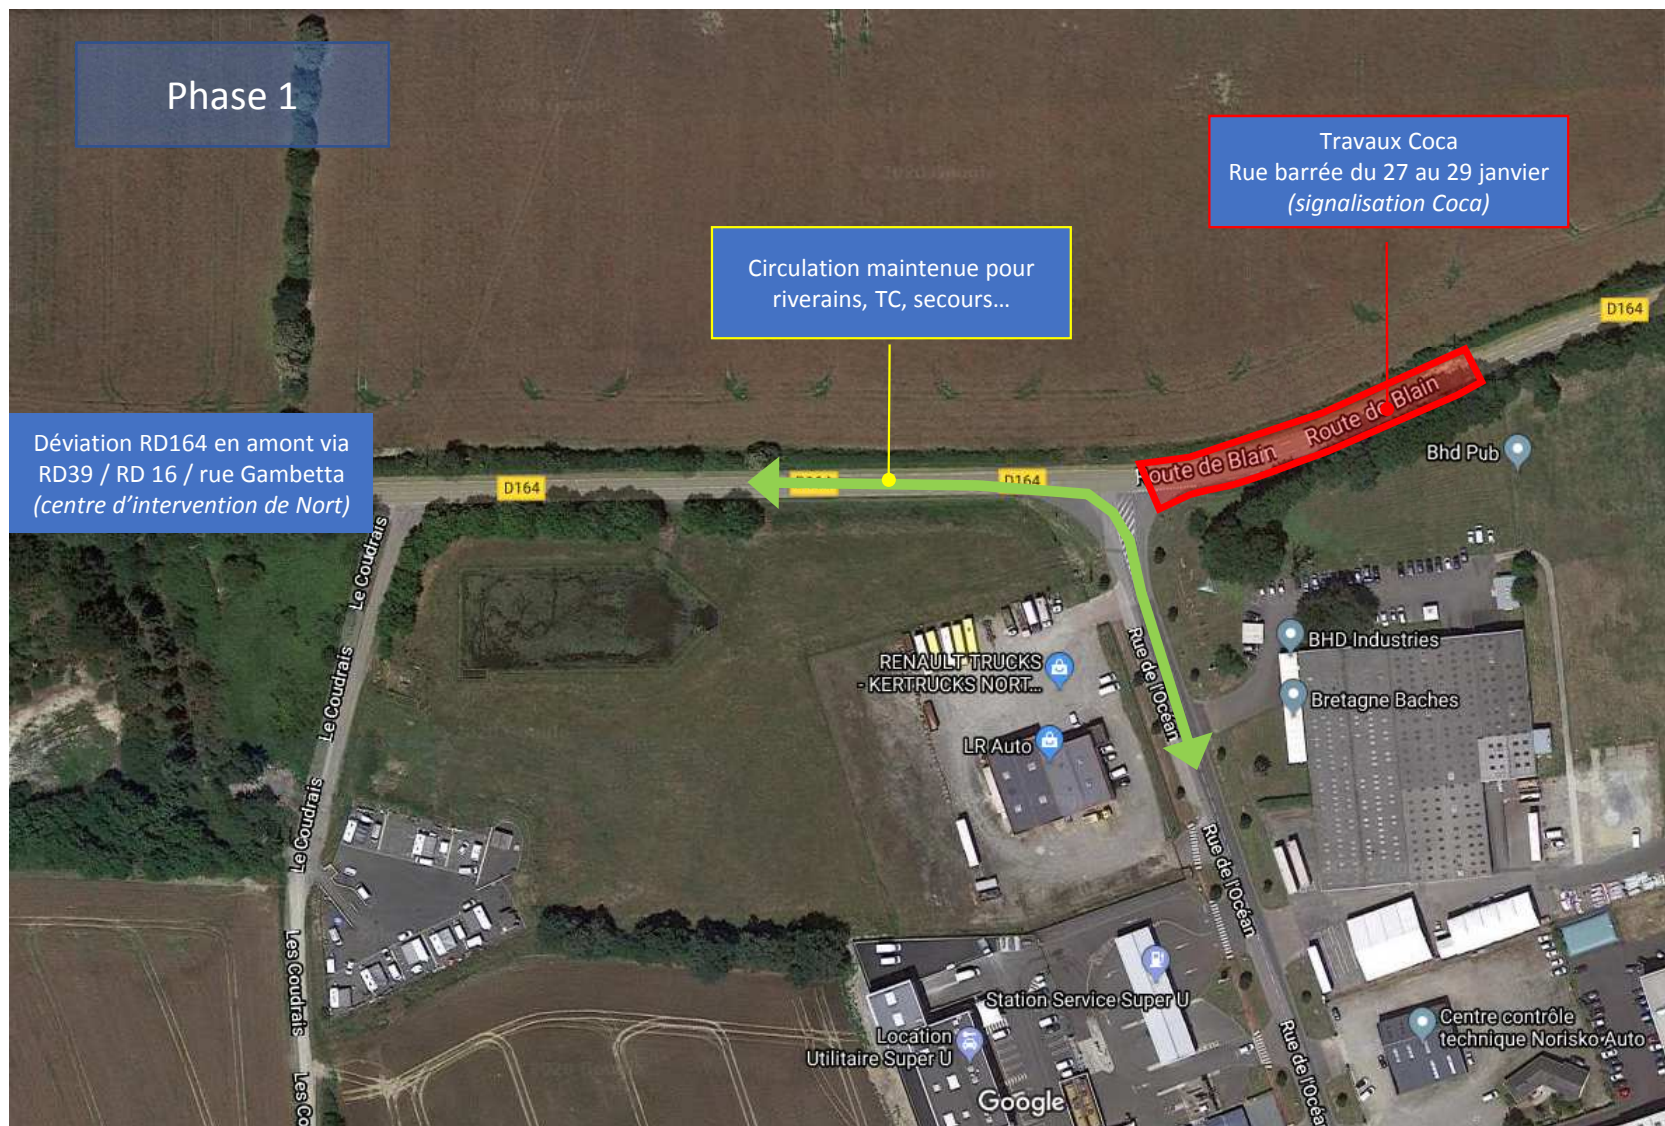


Phase 2

Déviation maintenue via
RD39 / RD 16 / rue Gambetta
(centre d'intervention de Nort)

Circulation par alternat
Itinéraire bis par rue de l'Atlantique
pour TC, secours, riverains...

Travaux Coca le 30 janvier
Rue de l'Océan barrée
RD164 sous alternat
(signalisation Coca)

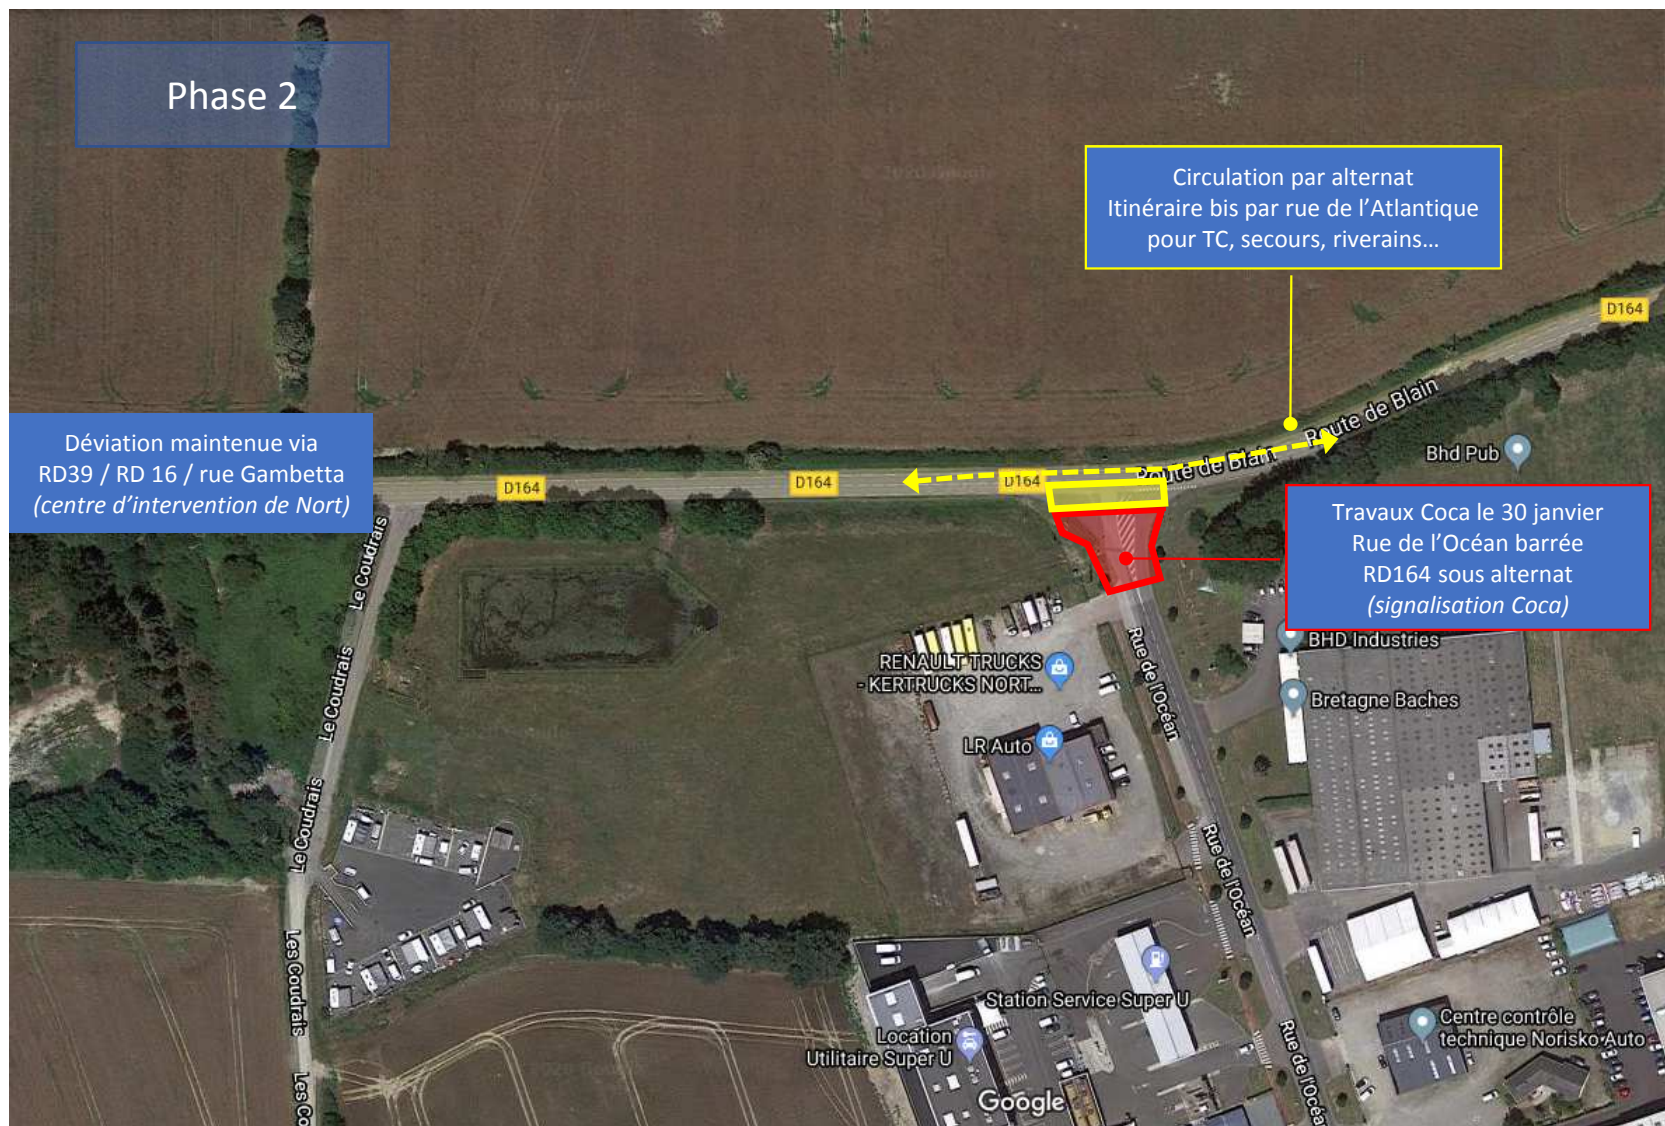

Phase 3


Circulation maintenue

Circulation maintenue
sous alternat

Travaux Coca
Hors zone de circulation
Du 3 au 7 février

Travaux Eiffage *
Alternat du 3 au 7 février
(signalisation Eiffage)

*Traversée de chaussée
par fonçage

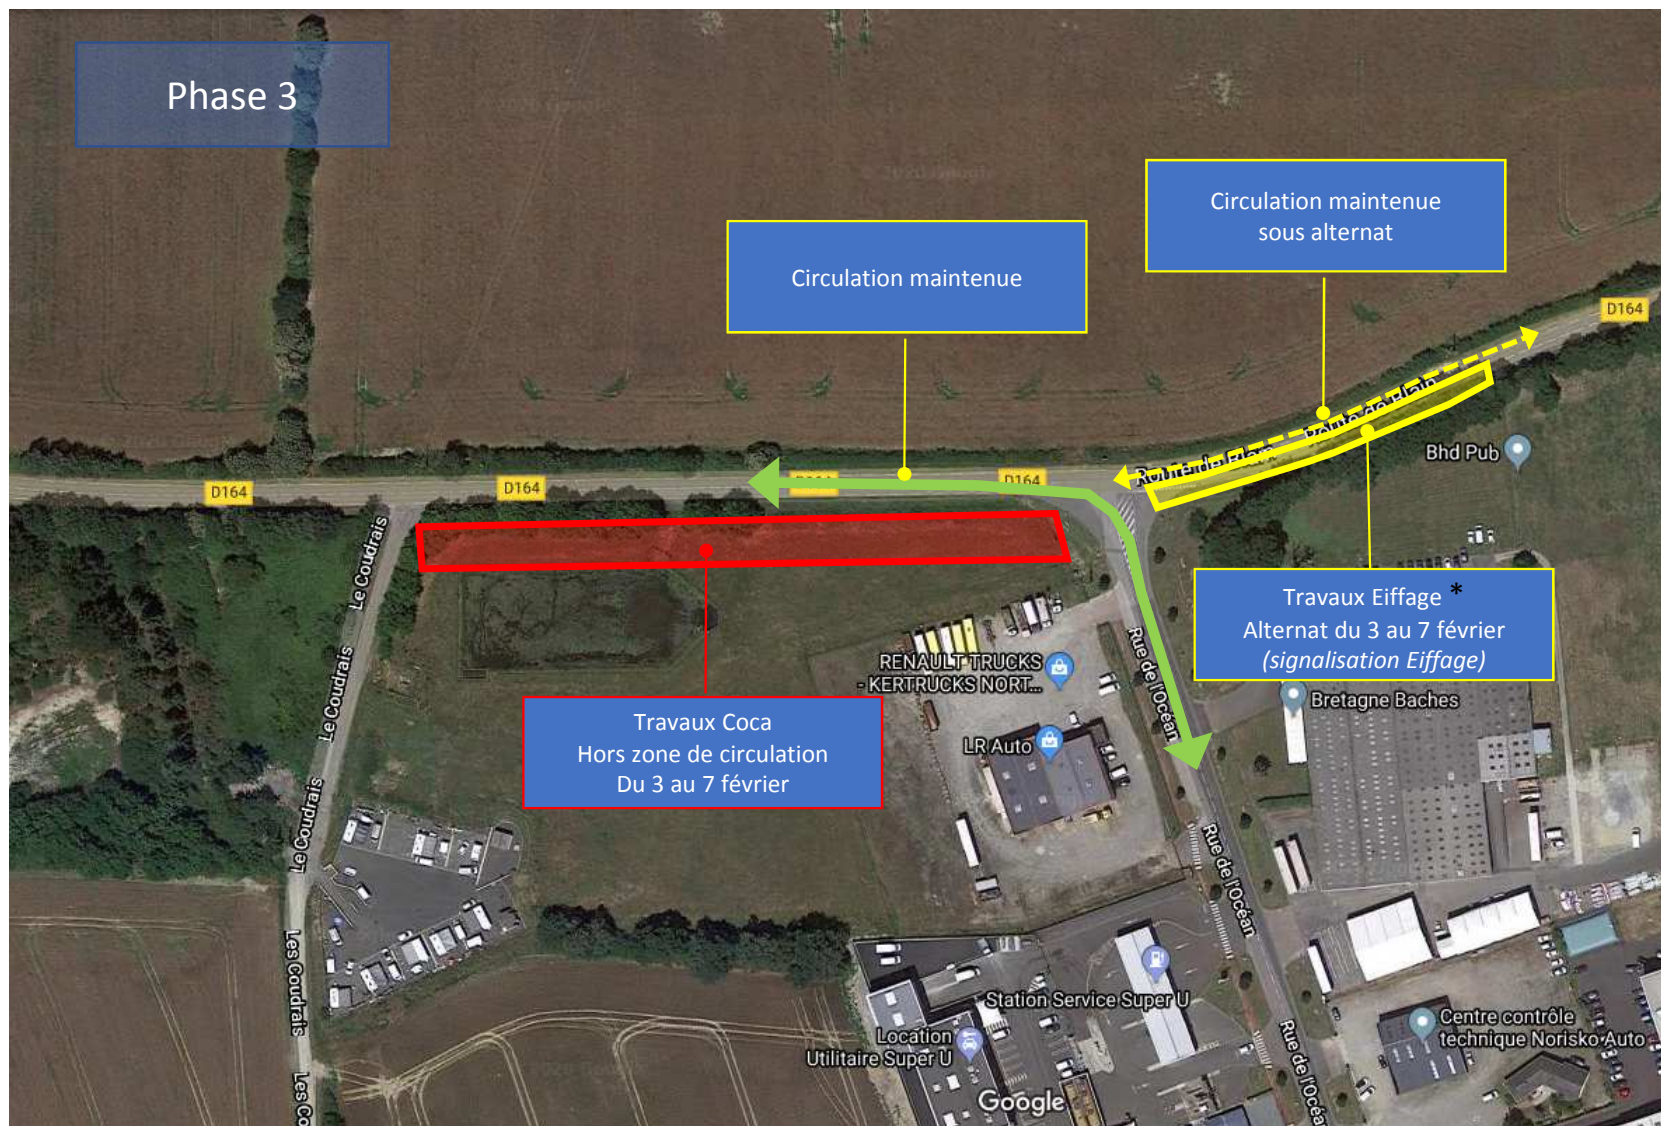

Phase 4


Durant la phase 4a uniquement:
Déviation RD164 en amont via
RD39 / RD 16 / rue Gambetta
(centre d'intervention de Nort)

Circulation maintenue

Phase 4a: Travaux Eiffage *
Alternat 2 jours entre le 6 et le
10 février (à préciser)
(signalisation Eiffage)

Phase 4b: Travaux Eiffage
Hors zone de circulation
Du 10 au 14 février

* En fonction
avancement travaux
Eiffage en phase 3

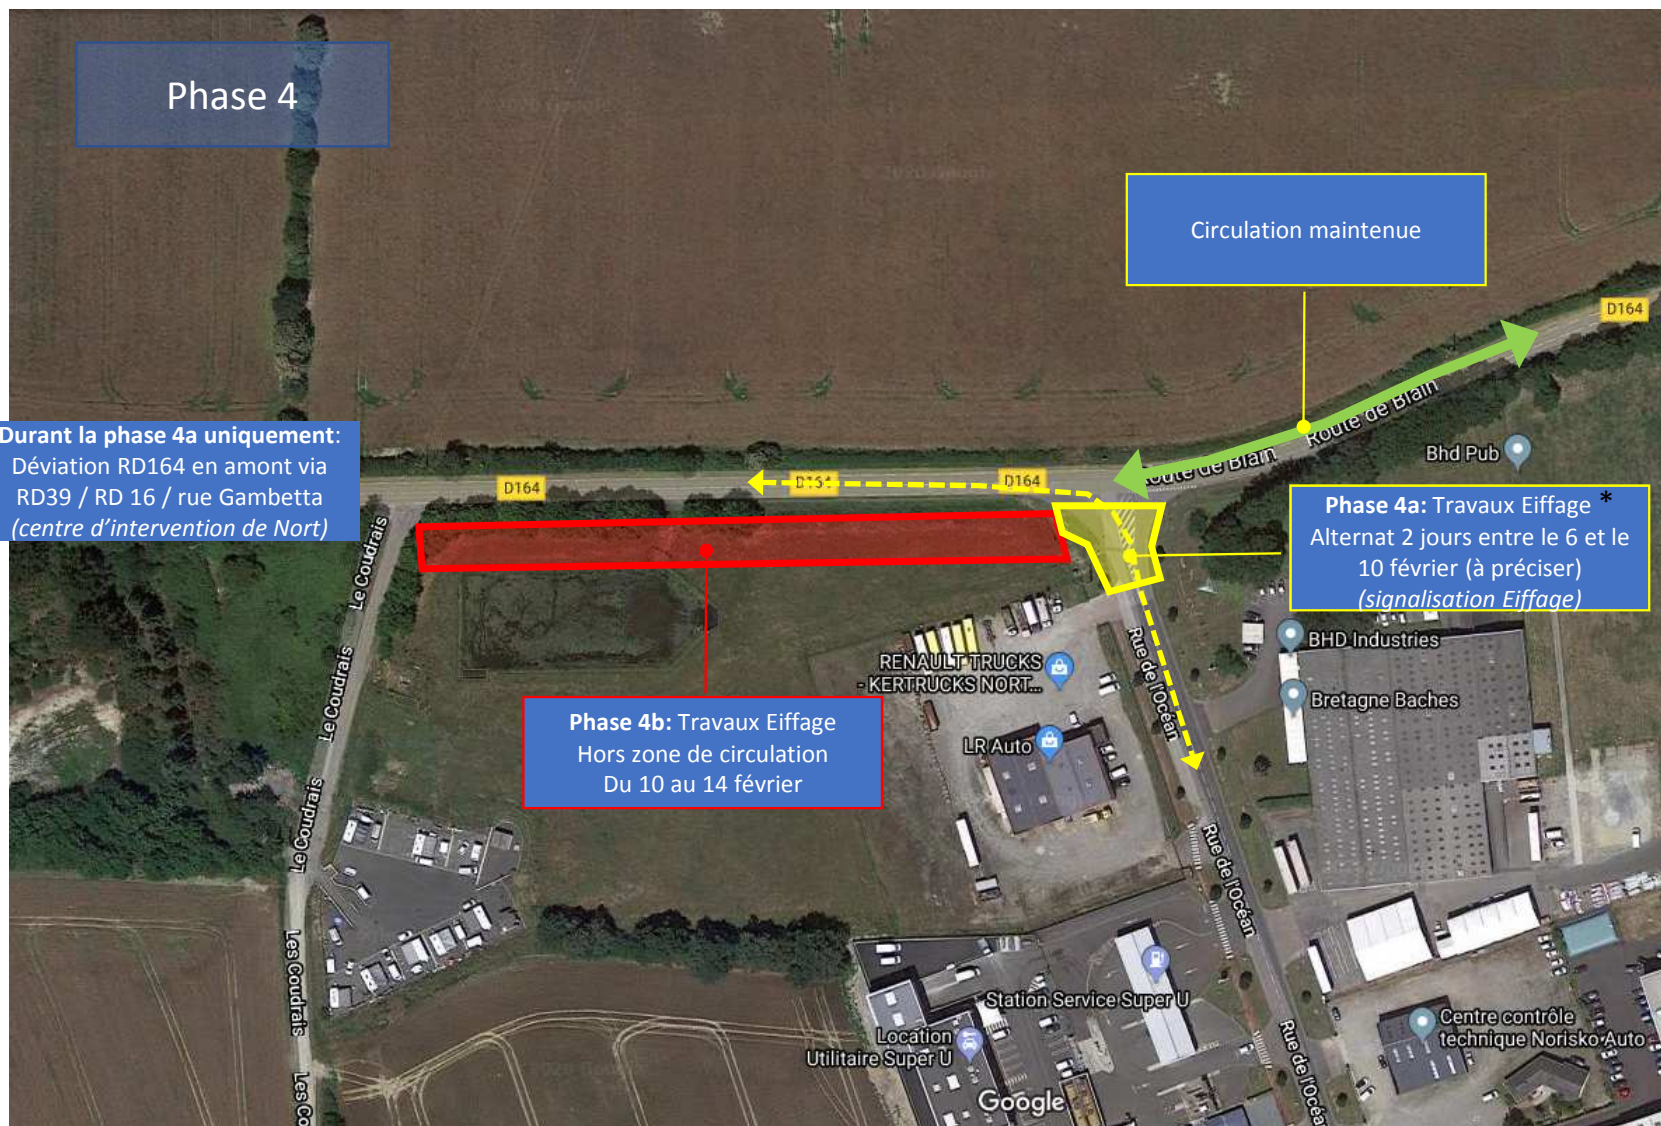

Phase 5

Déviation RD164 en amont via
RD39 / RD 16 / rue de l'Océan
(centre d'intervention de Nort)

Travaux Colas : route barrée du 17 au 21/02 y
compris TC (vacances scolaires) **et secours***
(Signalisation Colas)

*Déviation à préciser
dans l'arrêté pour les
services de secours

Circulation ponctuellement
sous alternat (1 jour à définir)

Travaux Coca
Reprise des branchements
entre le 17 et le 21/02
(signalisation Coca)

